

# Tryktest

Tryktest i henhold til DIN1988-2 for præisoleret rørsystem Flexalen®



## Nødvendigt værktøj

Trykpumpe


Påfyldningsenhed

Trykmåler (med tilbehør)

## Instruktioner til tryktesten

### Anvendelsesbetingelser og forberedelse

- Omgivelsestemperatur: >0°C
- Alle tilslutninger er foretaget, og alle svejsninger er afkølet i mindst 2 timer siden (24 timer for fittings ≥125 mm), oplysninger om andre tilslutningstyper finder du i vores installationsvejledning.
- Alle endepunkter er blevet forseglet, eller ventilerne til andre systemdele er lukket og mærket med "må ikke betjenes/åbnes".

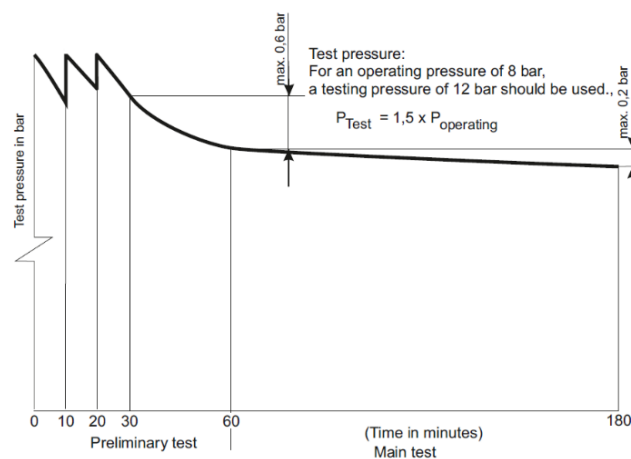

01. Udfør **lækagetest** med drikkevand (maks. 0,5 bar). Målepunktet er det laveste punkt i rørsystemet. Start først tryktesten, når lækagetesten er vellykket (der er ingen lækager)!

**Bemærk:** Brug kun luft til lækagetest, hvis det er nødvendigt, og brug kun kompressor med olieudskillere.

02. Udfør en **indledende tryktest** ved 1,5 gange arbejdsstrykket. Trykket skal kontrolleres hvert 10., 20. og 30. minut og om nødvendigt bringes tilbage til det samme niveau (til 1,5 x arbejdsstrykket). Den indledende test er vellykket, hvis trykfaldet mellem 30 minutter og 1 time er mindre end 0,6 bar.

03. Udfør **hovedtryktesten** umiddelbart efter den indledende test. Testens varighed er mindst 2 timer (120 min). Hovedtryktesten er vellykket, hvis trykfaldet under testen er mindre end 0,2 bar over hele systemet.

UNDER TRYKTESTEN SKAL RAPPORTEN UDFYLDES (næste side)

### Ansvarsfraskrivelse

Alle anbefalinger og oplysninger på dette datablad er baseret på vores viden og erfaring. Produktspecifikationer er tænkt som retningslinjer. Da servicevilkår er uden for vores kontrol, skal brugere sikre sig, at produkterne er egnede til den tilsigtede anvendelse. Der er ikke givet eller underforstået nogen garanti eller garanti, eller at enhver brug af produkter ikke kræver rettigheder, der tilhører andre parter. Vi forbeholder os ret til at ændre produktdesign og egenskaber uden varsel.

# Rapport vedr. trykprøvning

Objekt: \_\_\_\_\_

## Foreløbig test

Starttryk \_\_\_\_\_ bar

(1,5 x arbejdstryk)

Tryk efter 30 minutter \_\_\_\_\_ bar

Tryk efter 60 minutter \_\_\_\_\_ bar

(maks. trykfald på 0,6 bar mellem 30 minutter og 1 time)

Lækage ja  nej

## Hovedtest

Starttryk \_\_\_\_\_ bar

(Sluttryk for indledende test)

Tryk efter 120 minutter \_\_\_\_\_ bar

(maks. trykfald på 0,2 bar fra begyndelsen)

Lækage ja  nej

Installatør / Firma: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift
