

Tryktest


Tryktest i henhold til DIN1988-2 for præisoleret rørsystem Flexalen®



Instruktioner til tryktesten

Anvendelsesbetingelser og forberedelse

- Omgivelsestemperatur: >0°C
- Alle tilslutninger er foretaget, og alle svejsninger er afkølet i mindst 2 timer siden (24 timer for fittings ≥125 mm), oplysninger om andre tilslutningstyper finder du i vores installationsvejledning.
- Alle endepunkter er blevet forsegleet, eller ventilerne til andre systemdele er lukket og mærket med "må ikke betjenes/åbnes".

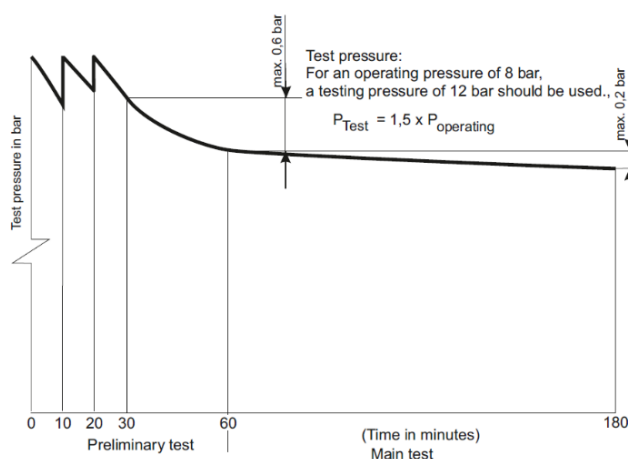

01.

Udfør **lækagetest** med drikkevand (maks. 0,5 bar). Målepunktet er det laveste punkt i rørsystemet. Start først tryktesten, når lækagetesten er vellykket (der er ingen lækager)!

Bemærk: Brug kun luft til lækagetest, hvis det er nødvendigt, og brug kun kompressor med olieudskiller.

02.

Udfør en **indledende tryktest** ved 1,5 gange arbejdstrykket. Trykket skal kontrolleres hvert 10., 20. og 30. minut og om nødvendigt bringes tilbage til det samme niveau (til 1,5 x arbejdstrykket). Den indledende test er vellykket, hvis trykfaldet mellem 30 minutter og 1 time er mindre end 0,6 bar.

03.

Udfør **hovedtryktesten** umiddelbart efter den indledende test. Testens varighed er mindst 2 timer (120 min). Hovedtryktesten er vellykket, hvis trykfaldet under testen er mindre end 0,2 bar over hele systemet.

UNDER TRYKTESTEN SKAL RAPPORTEN UDFYLDES (næste side)

Ansvarsfraskrivelse

Alle anbefalinger og oplysninger i dette datablad er baseret på vores viden og erfaring. Produktspecifikationerne er tænkt som retningslinjer. Da serviceforholdene er uden for vores kontrol, skal brugerne selv sikre sig, at produkterne er egnede til den tilsigtede brug. Der gives eller antydes ingen garanti for, at enhver brug af produkterne ikke vil krænke rettigheder, der tilhører andre parter. Vi forbeholder os ret til at ændre produktdesign og -egenskaber uden varsel.

Rapport vedr. trykprøvning

Objekt: _____

Foreløbig test

Starttryk _____ bar
(1,5 x arbejdstryk)

Tryk efter 30 minutter _____ bar

Tryk efter 60 minutter _____ bar
(maks. trykfald på 0,6 bar mellem 30 minutter og 1 time)

Lækage ja nej

Hovedtest

Starttryk _____ bar
(Sluttryk for indledende test)

Tryk efter 120 minutter _____ bar
(maks. trykfald på 0,2 bar fra begyndelsen)

Lækage ja nej

Installatør / Firma: _____

Dato

Underskrift

Ansvarsfraskrivelse

Alle anbefalinger og oplysninger i dette datablad er baseret på vores viden og erfaring. Produktspecifikationerne er tænkt som retningslinjer. Da serviceforholdene er uden for vores kontrol, skal brugerne selv sikre sig, at produkterne er egnede til den tilsigtede brug. Der gives eller antydes ingen garanti for, at enhver brug af produkterne ikke vil krænke rettigheder, der tilhører andre parter. Vi forbeholder os ret til at ændre produktdesign og -egenskaber uden varsel.
